
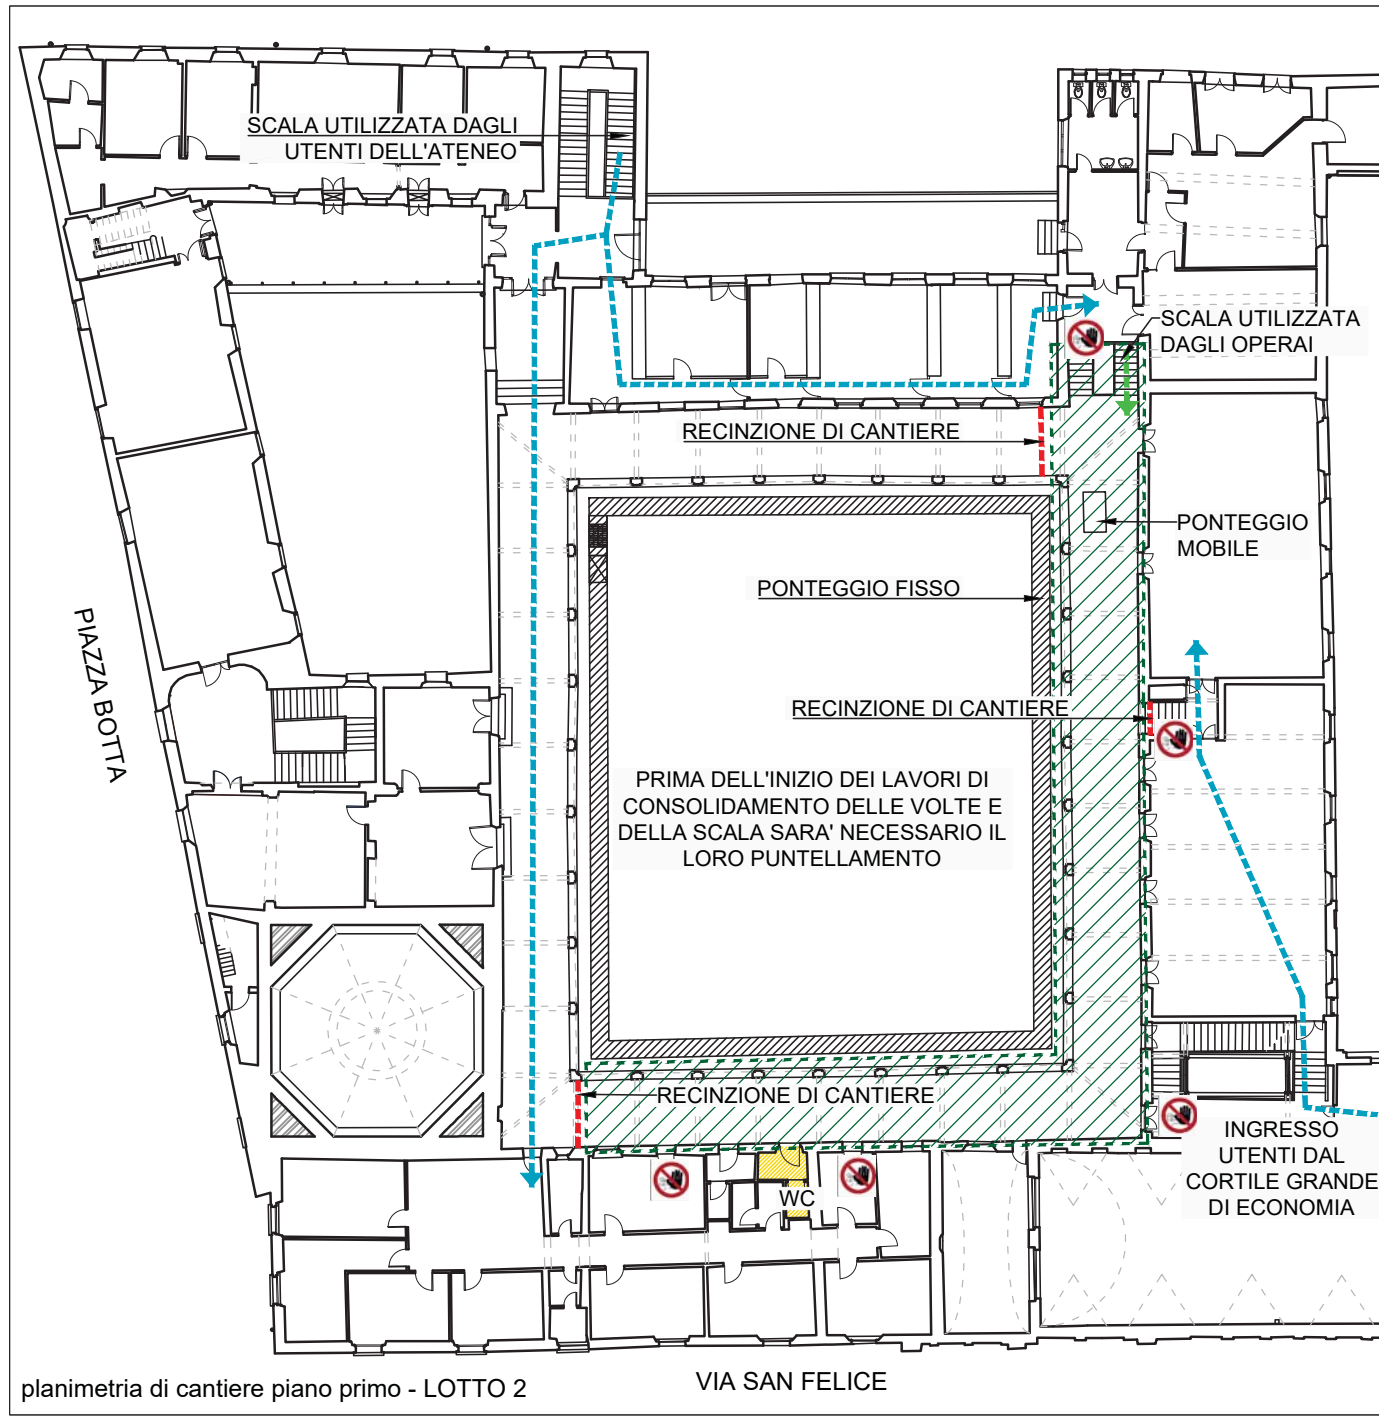


- LOTTO 1: Lavori in copertura (durata 6 mesi)**
- Sollevamento del manto di copertura
 - Rinforzo e consolidamento strutturale degli elementi lignei della copertura
 - Sistemazione del manto di copertura e del sottotetto
 - Realizzazione del sistema di linee vita
 - Revisione, sistemazione ed integrazione del sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane (gronde, pluviali, scossaline)

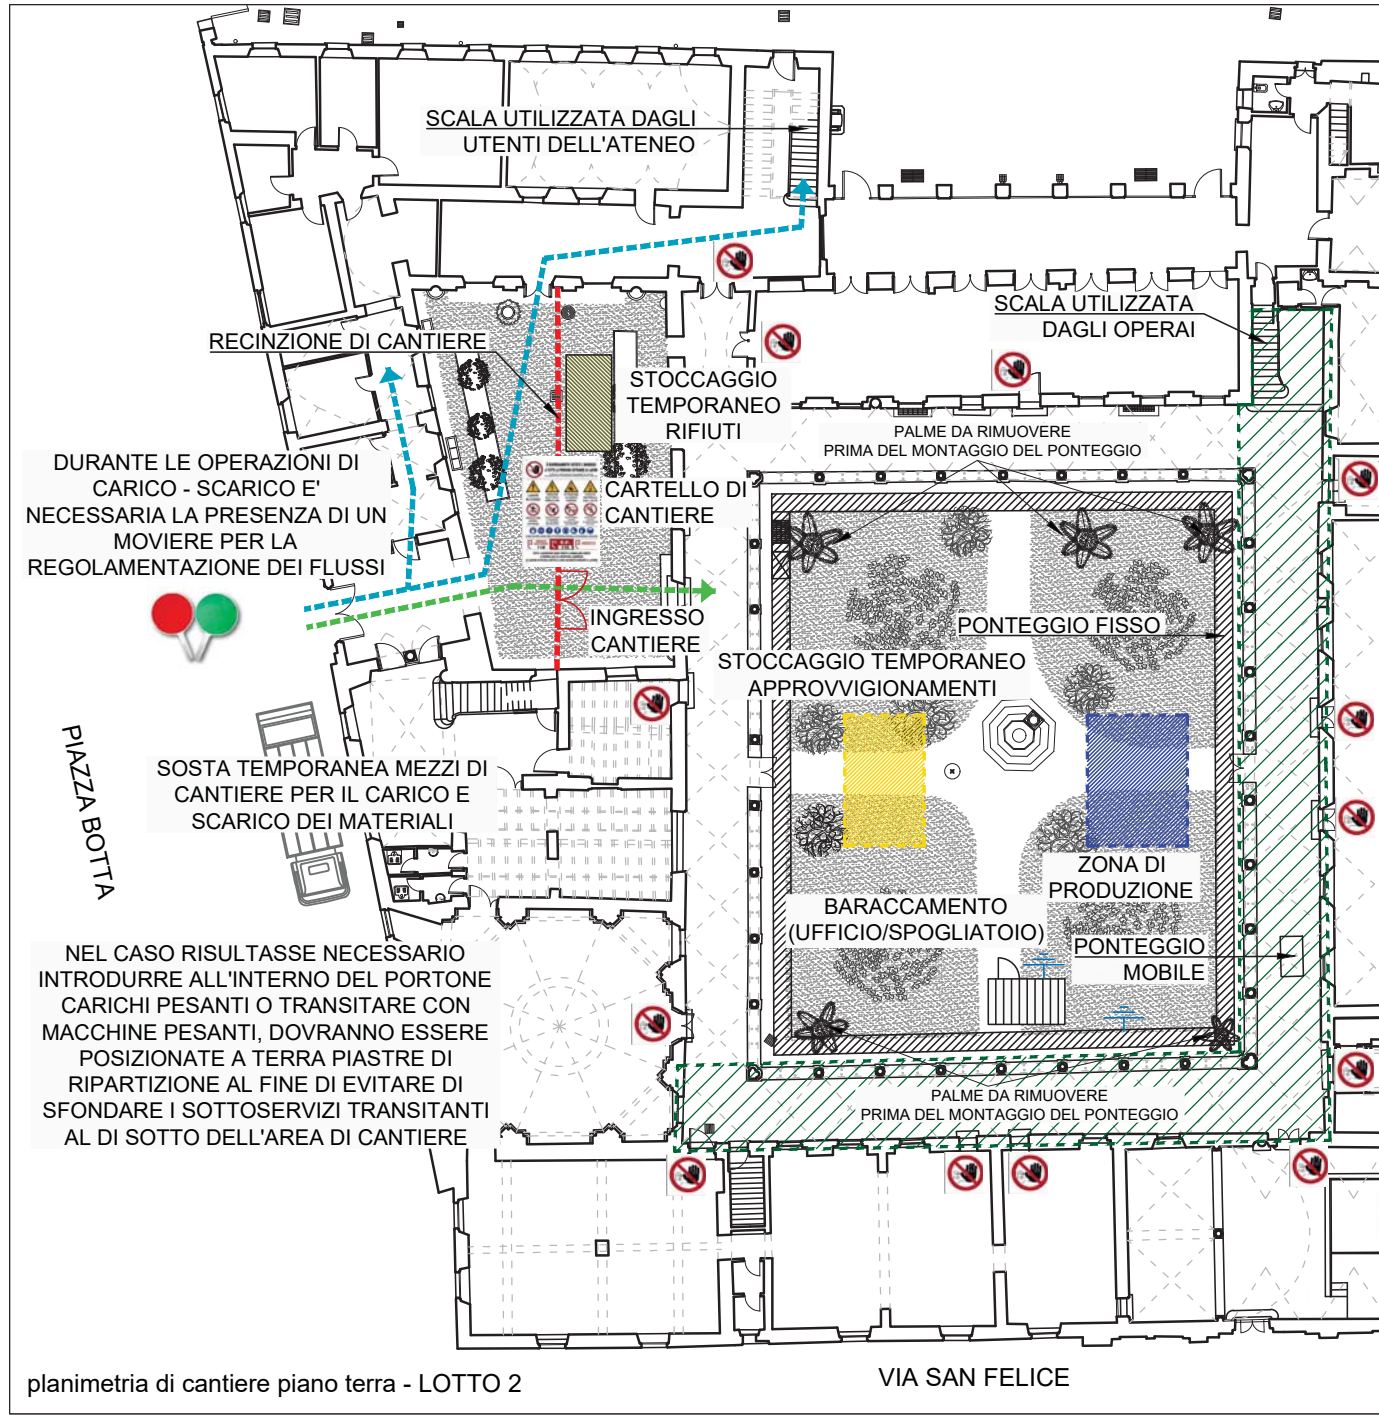

- LOTTO 2: Lavori sotto il porticato piano terra e primo (durata 8 mesi)**
- Demolizione pavimenti esistenti piano terra e realizzazione del vespaio
 - Demolizione del pavimento piano primo, svuotamento, rinforzo e consolidamento strutturale delle volte in murature
 - Rinforzo e consolidamento strutturale degli elementi portanti del loggiato (colonne)
 - Rinforzo e consolidamento strutturale della scala di collegamento tra il piano terra e primo
 - Ripristino dei serramenti e messa in sicurezza delle vetrate
 - Revisione e sistemazione di elementi metallici e nuovi parapetti
 - Rimozione di impianti non più utilizzati o collocati in posizioni incoerenti
 - Integrazioni e sostituzioni di impianti elettrici e WI-FI
 - Posa nuovi corpi illuminanti
 - Realizzazione della pavimentazione in ciottolato
